

Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 370

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California Sur, siendo las 09:15 horas del día 13 de junio de 2017, en las oficinas del Fideicomiso, se llevó a cabo la **TRICENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS** del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- I. LISTA DE ASISTENCIA.
- II. INSTALACIÓN DEL QUÓRUM.
- III. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
- IV. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR – FIRMA.
- V. INFORMES DE TRABAJO.

A) PAVIMENTACIÓN CALLE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA EN SJC.
Coordinador de Obras.

09:00 / 40min

B) PAVIMENTACIÓN CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL.
Coordinador de Obras.

C) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) EN CSL.
Coordinador de Obras.

D) PROYECTO EJECUTIVO READECUACIÓN NODO VIAL "Y" EN SJC.
Coordinador de Obras.

E) CARTERA DE OBRAS FOIS 2017
Coordinador de Obras.

VI. CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se pasó la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente acta.

Punto Dos. Instalación del Quórum Legal. Se determina que existe quórum legal para la celebración de la reunión.

Punto Tres. Aprobación del Orden del Día. Se aprueba el orden del día.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo


Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 370

El presidente del Subcomité presenta a los integrantes al Ing. Manuel de Jesús Acosta Gastelum como representante suplente del Colegio de Ingenieros.


PAVIMENTACIÓN CALLE MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA EN SJC.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotográfico de avances de la obra. Se integra al informe de avances grafica de avances en comparación con programa de trabajo. Se le indico a la contratista por escrito del atraso que presenta en el programa de ejecución de los trabajos; en caso de no cumplir con el programa de ejecución, perderá las retenciones aplicadas en las estimaciones y se la aplicará la sanción prevista en el contrato. Se indicó que la próxima semana reiniciarían los trabajos de pavimentación.

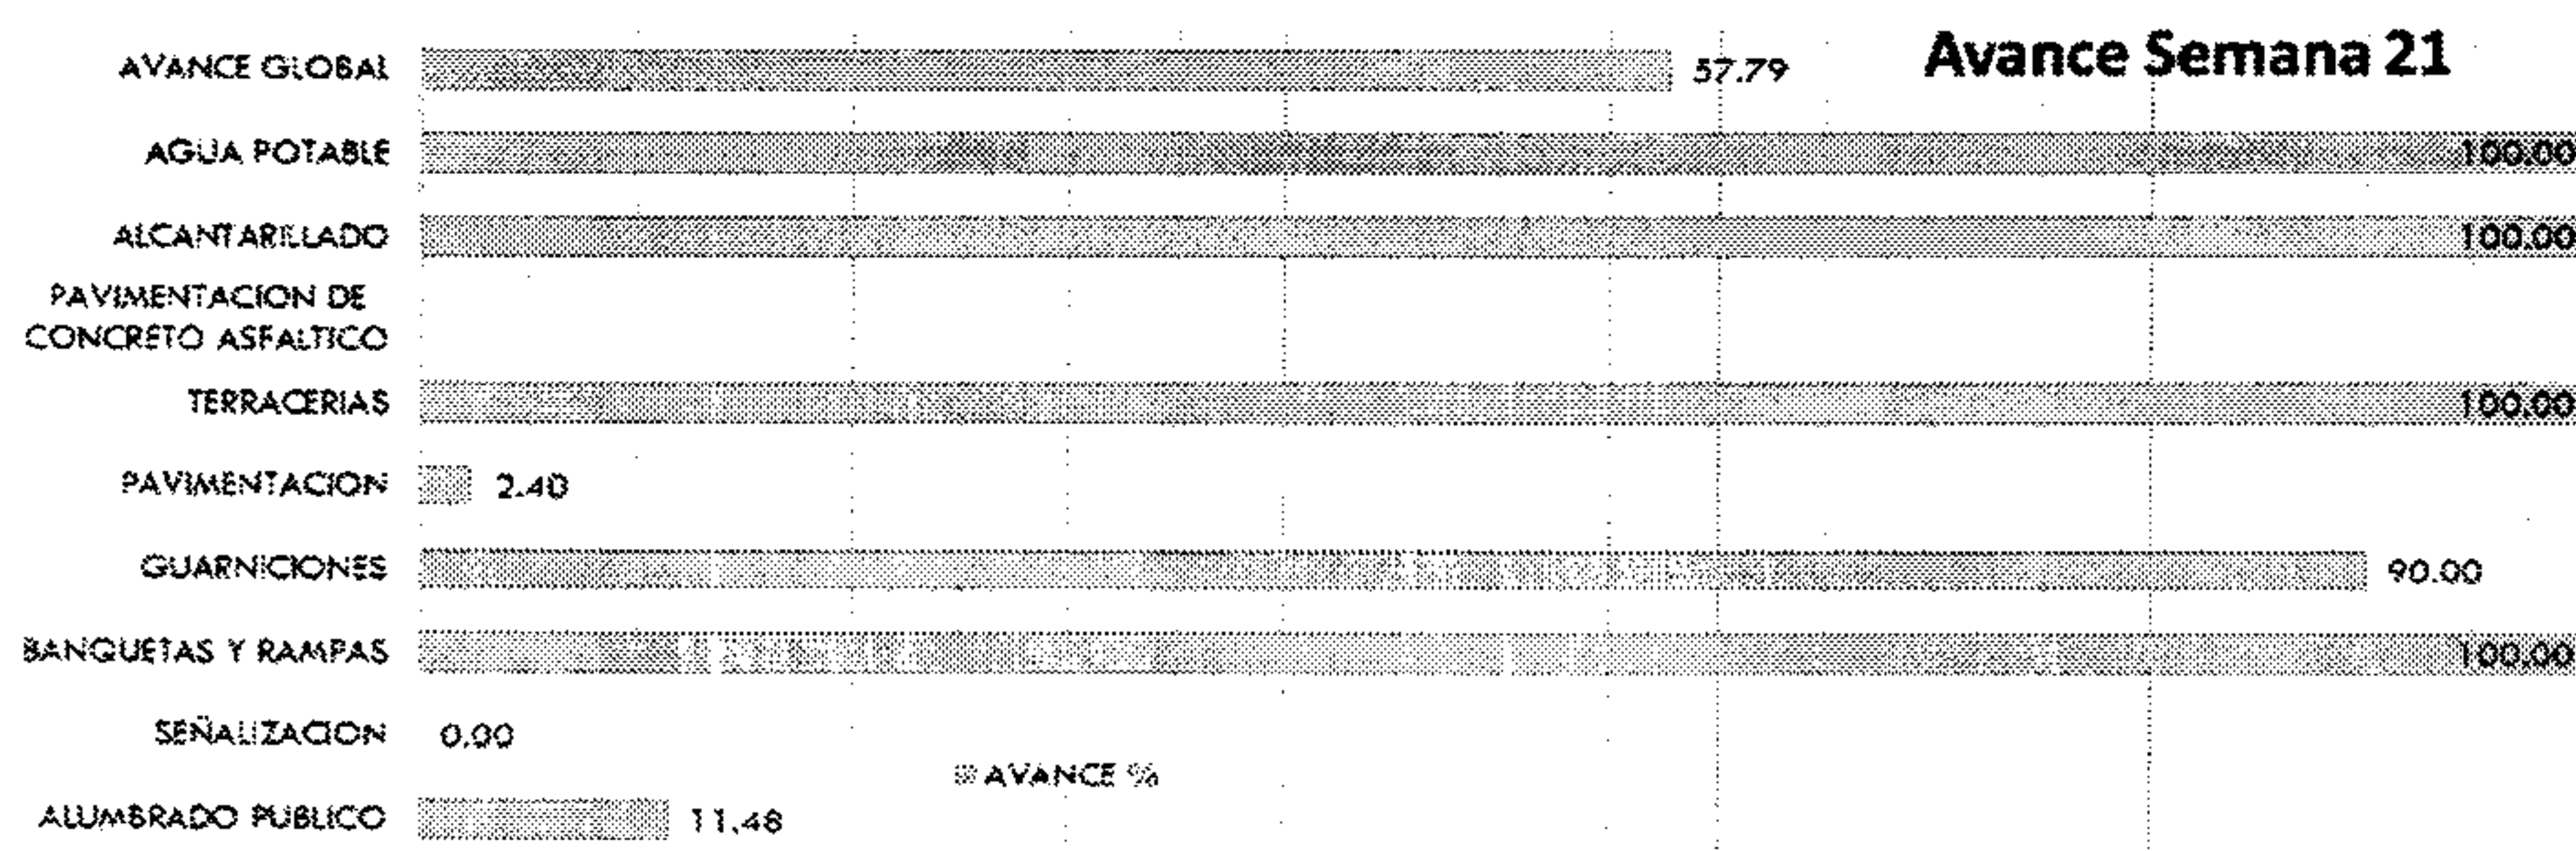

PAVIMENTACIÓN CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotográfico de avances de la obra. Se integra al informe de avances grafica de avances en comparación con programa de trabajo.

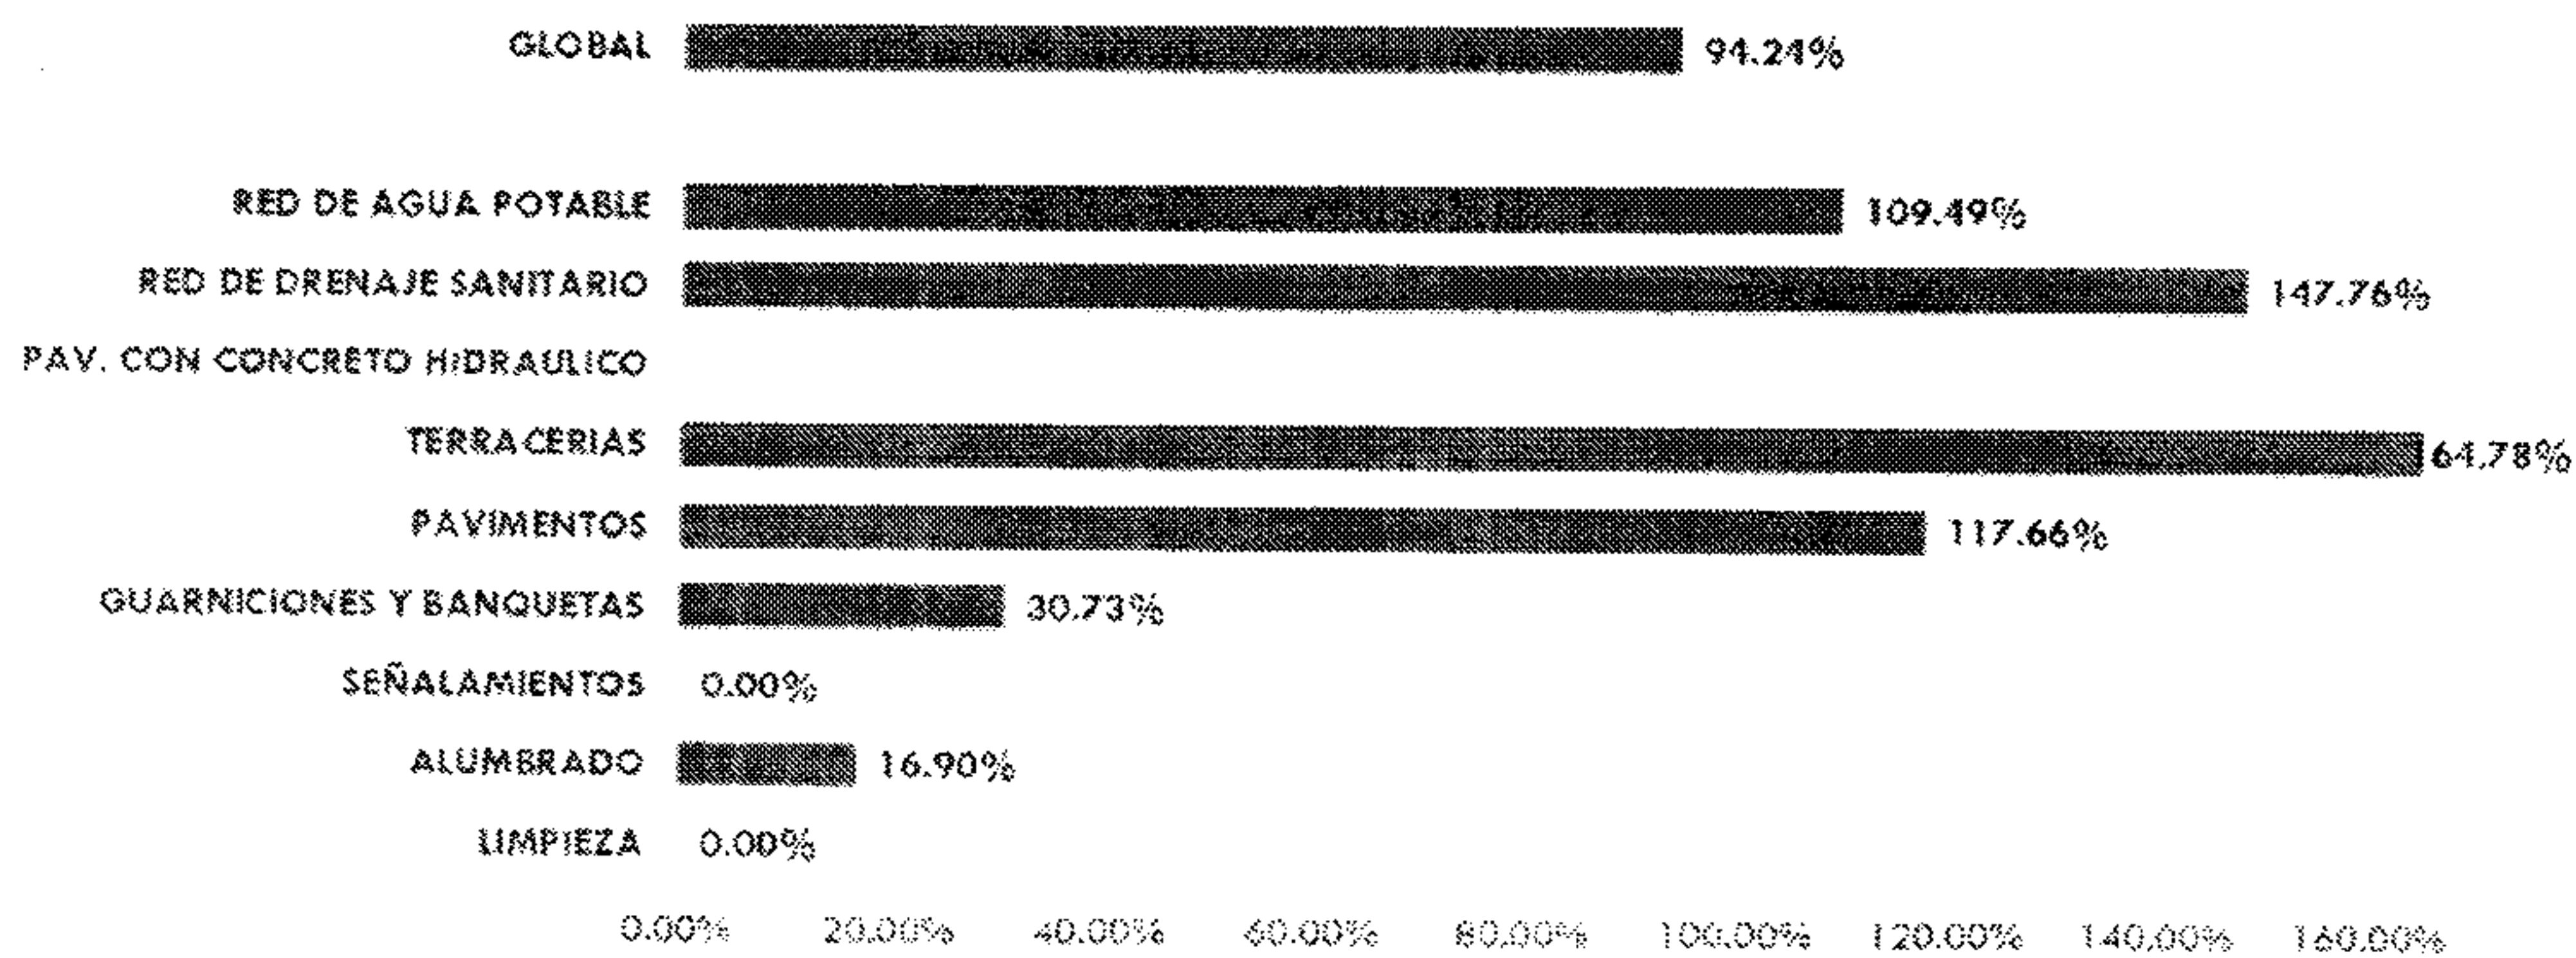

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El coordinador de obras informa los integrantes del Subcomité que se tiene programada junta técnica para el día 22 de junio con proyectista para la entrega del proyecto con ingeniería de costos. Asimismo se entregará proyecto definitivo a CONAGUA para poder programar reunión de seguimiento con sus representantes del área técnica. En seguimiento la representante de la Sindicatura Municipal informa que se encuentran en trámite ante CONAGUA en la Cd. De México el cambio de titularidad del terreno

Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 370

"Yenekamu" en cuanto se tenga formalizado se procederá a la celebración de un convenio para la aportación del proyecto mismo que contará con la participación de la junta técnica del FOIS para su óptimo desarrollo. Analizan en paralelo el mecanismo jurídico que permita el uso del terreno sin pago de derechos de concesión ya que el Municipio no se encuentra en posibilidad de adsorber el costo de una concesión. Para dar seguimiento a los puntos pendientes manifiesta que no han sido aprobados gastos viáticos para asistencia a la Cd. De México con CONAGUA.

ACUERDO

SO-370-1 Se acuerda enviar un oficio al Delegado de Cabo San Lucas, solicitando su apoyo para evitar el uso del área ya desalojada donde se ejecutará el PIC para evitar nuevos asentamientos irregulares.

PROYECTO EJECUTIVO READECUACIÓN NODO VIAL "Y" EN SJC.


El coordinador de obras informa a los integrantes que se dio seguimiento a la propuesta ante S.C.T. de la vuelta en U para retorno hacia el sur en la modificación geométrica del nodo "Y" sin el carril de desaceleración y almacenamiento de 107 metros de largo que originalmente se había propuesto; informan que entregarán oficio con el visto bueno al proyecto el día miércoles 14 de junio.

CARTERA DE OBRAS 2017.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotográfico de avances del Proyecto Ejec. Modificación Geométrica del Entronque Vado Santa Rosa, SJC

BLOQUE II

PROYECTO EJEC. MODIFICACIÓN GEOMÉTRICA DEL ENTRONQUE VADO SANTA ROSA, SJC.

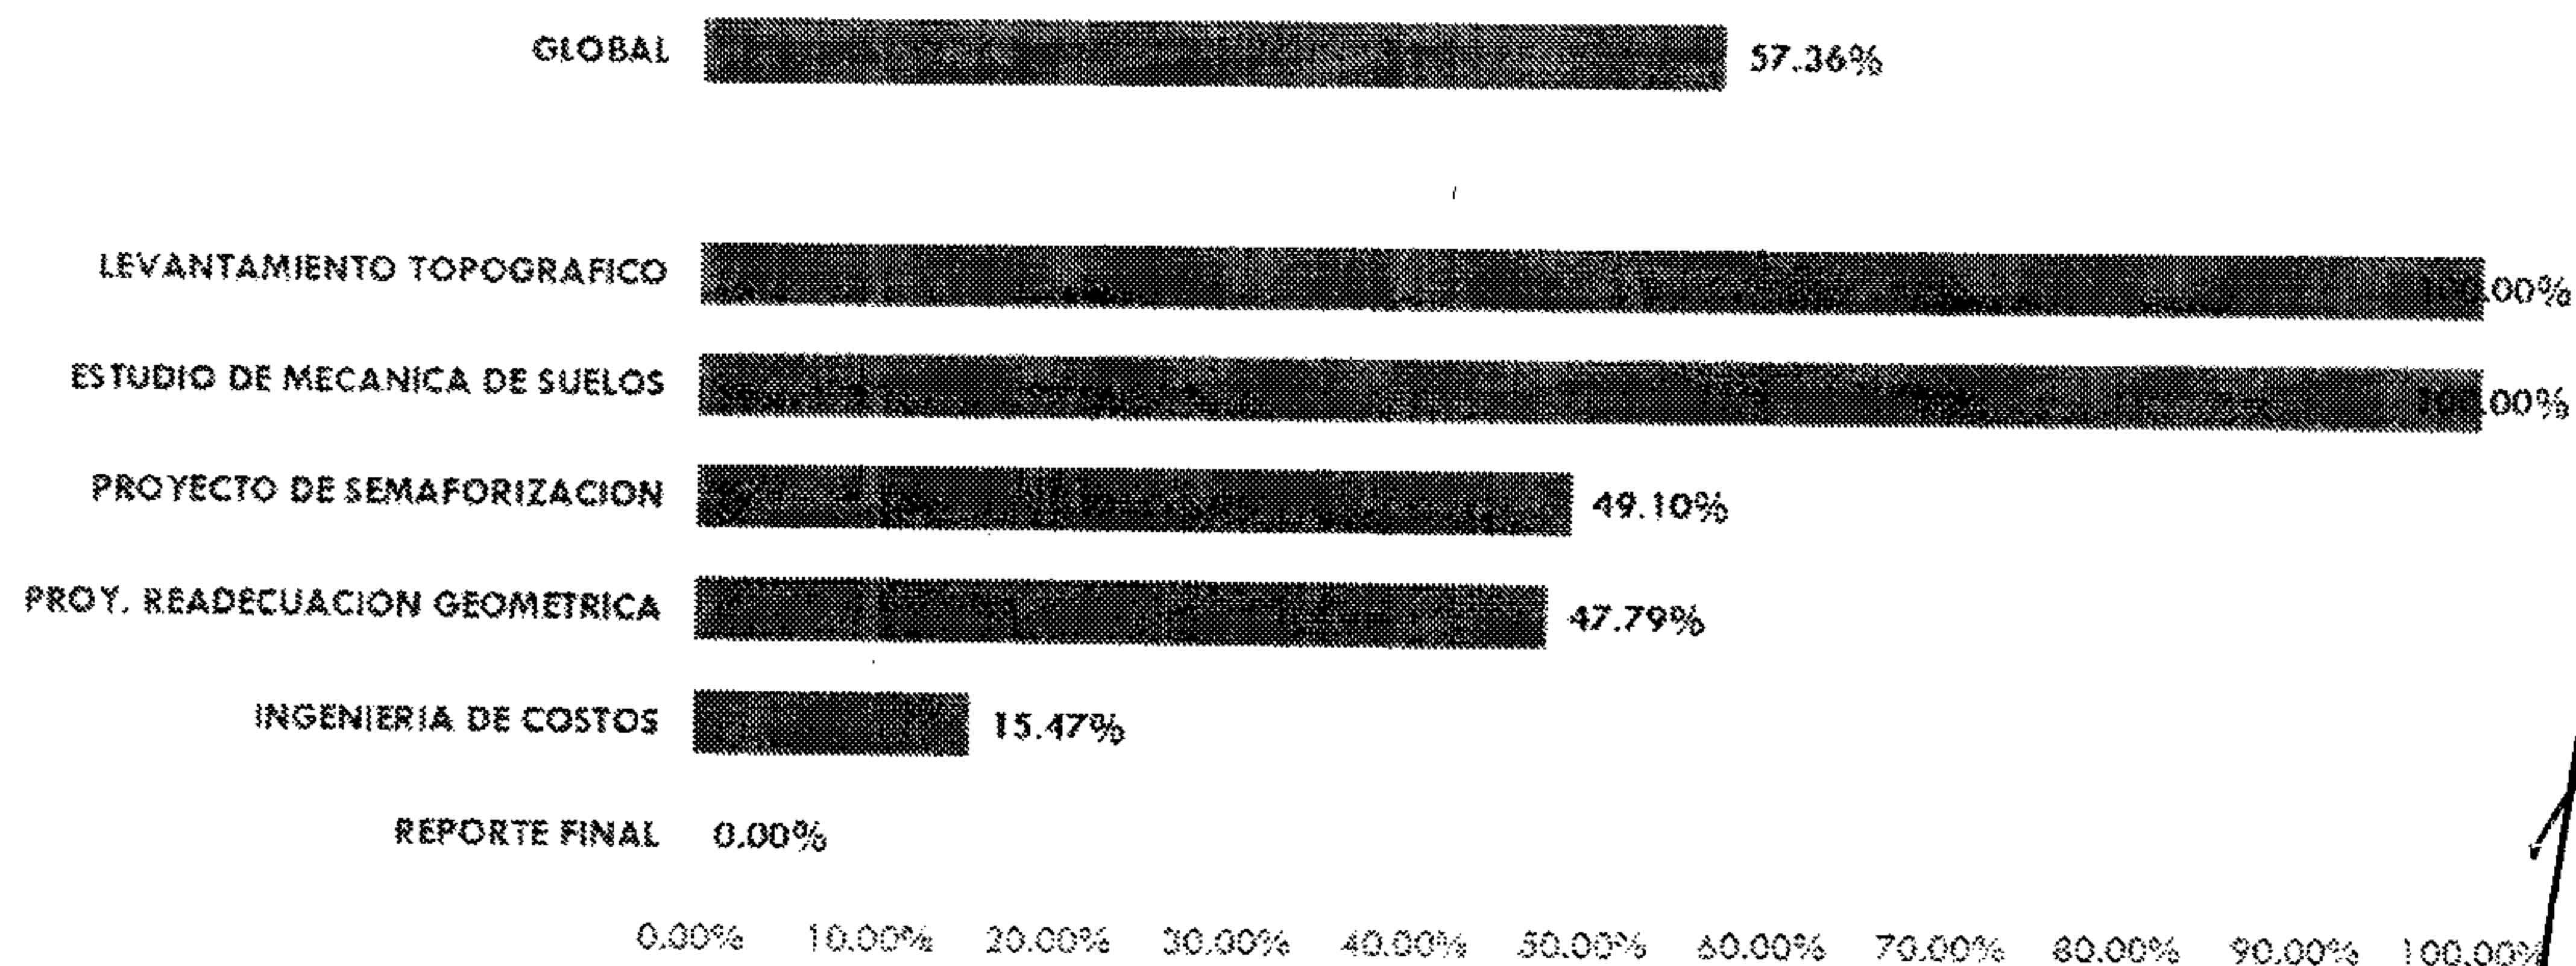

Punto Ocho. Clausura. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunión siendo las 09:55 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.


Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 370

ORGANISMO	PROPIETARIO	SUPLENTE
Gobierno Estatal	Miguel Ángel Hernández Vicent	Fernando Patiño Romero
Gobierno Estatal	José Luis Escalera Morfin	Urbano Barrera Salvatierra
Congreso del Estado	Guadalupe Saldaña Cisneros	Sergio García Covarrubias
Gobierno Municipal	Francisco Rubio Castro	Celestino Atienzo Beltrán
Gobierno Municipal	Susana Zatarain García	Alejandra Gutiérrez Llaca
Gobierno Municipal	Marco A. Camarena Duarte	Heriberto Anaya Castillo
Gobierno Municipal	Alvaro Ramírez Gálvez	Oscar Olea Mendivil
Colegio de Arquitectos	Hugo Espinosa García	Juan Yoshio Urakami Osuna
Colegio de Ingenieros	Gilberto Lira Garcés	Manuel Acosta Gastelum
ITES	Adalberto Pérez Pérez	Sergio E. Mendoza Ruiz
CANACINTRA	Edgar Abel Angulo Araujo	Arturo F. Peraza Grijalva
Consejo Coordinador	Julio Cesar Castillo Gómez	Fabián Cervantes Gil
Consejo Coordinador	Francisco Parra Carriedo	Jorge Carrera Tovar
Consejo Coordinador	Jorge Tinoco Uscanga	Sergio Adler Przasnyski

Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 370

Consejo Coordinador	Hilda Arras Rueda	
Asociación de Hoteles	Enrique Montes de Oca T.	Paloma Palacios Domínguez
Contraloría General	Sonia Murillo Manríquez	Alejandro Carrillo Reyes
Contraloría Municipal	Miguel A. Germán Lugo	Alejandro Bringas Sánchez
IMPLAN	Horacio González A.	José Manuel Guriel Castro
OOMSAPAS	Rene Núñez Cosío	Rodolfo Cuellar Albarran

